| Nr. | Vorgangsname | Kontaktperson | Dauer | Anfang | Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Gesamtbauzeit** | | **140 Tage?** | **Di 10.03.09** | **Mo 28.09.09** |
| 2 | **Ausführungsphase Rohbau** | | **46 Tage?** | **Di 10.03.09** | **Do 14.05.09** |
| 3 | Erdarbeiten, Erstellung Bodenplatte/Keller | Bürkle | 14 Tage | Di 10.03.09 | Fr 27.03.09 |
| 4 | Kranmontage | Ökohaus Ibach | 1 Tag? | Mo 30.03.09 | Mo 30.03.09 |
| 5 | Montage Holzhaus | Ökohaus Ibach | 9 Tage | Mo 30.03.09 | Do 09.04.09 |
| 6 | Gerüst auf/abbau | Gerüstbauer | 30 Tage | Mi 01.04.09 | Do 14.05.09 |
| 7 | Kabelverlegung auf Dachschalung | Elsasser | 1 Tag | Fr 03.04.09 | Fr 03.04.09 |
| 8 | Montage Fenster/Bautür | Ökohaus Ibach | 4 Tage | Mo 06.04.09 | Do 09.04.09 |
| 9 | Richtfest ?? | | 1 Tag? | Mi 08.04.09 | Mi 08.04.09 |
| 10 | Einbau Kamin | Ökohaus Ibach | 1 Tag? | Mo 06.04.09 | Di 07.04.09 |
| 11 | Blechnerarbeiten | Egger | 2 Tage | Mi 08.04.09 | Do 09.04.09 |
| 12 | Ziegeldeckung | Ökohaus Ibach | 2 Tage | Di 14.04.09 | Mi 15.04.09 |
| 13 | Montage Solaranlage | Hierholzer | 2 Tage | Do 16.04.09 | Fr 17.04.09 |
| 14 | Aussenschalung Holz | *Eigenleistung* | 10 Tage | Mo 20.04.09 | Fr 01.05.09 |
| 15 | Aussenputzarbeiten | Gipser | 13 Tage | Mi 22.04.09 | Fr 08.05.09 |
| 16 | Montage Rollläden / Jalousien | Ökohaus Ibach | 1 Tag? | Mo 11.05.09 | Mo 11.05.09 |
| 17 | **Ausführungsphase Innenausbau** | | **117 Tage?** | **Di 14.04.09** | **Mo 28.09.09** |
| 18 | 1. Lage Gipskarton Innenwände | Ökohaus Ibach | 1 Tag | Di 14.04.09 | Di 14.04.09 |
| 19 | Rohinstallation Elektro - Innenwände | Elsasser | 5 Tage | Mi 15.04.09 | Di 21.04.09 |
| 20 | evtl. Rohinstallation Heizung / Sanitär | Hierholzer | 5 Tage | Mi 15.04.09 | Di 21.04.09 |
| 21 | Zellulosedämmung Innen- /Aussenwände | Ökohaus Ibach | 2 Tage | Mi 22.04.09 | Do 23.04.09 |
| 22 | Trocknungsphase Wanddämmung | | 10 Tage | Mi 22.04.09 | Di 05.05.09 |
| 23 | Montage Dampfbremse | *Eigenleistung* | 5 Tage | Mi 06.05.09 | Di 12.05.09 |
| 24 | Montage Installationsebene (Lattung) | *Eigenleistung* | 3 Tage | Mi 13.05.09 | Fr 15.05.09 |
| 25 | Dämmung Installationsebene | *Eigenleistung* | 3 Tage | Mo 18.05.09 | Mi 20.05.09 |
| 26 | Elektromontage Installationsebene | Elsasser | 5 Tage | Di 19.05.09 | Di 26.05.09 |
| 27 | Beplankung Innen- und Aussenwände, Gipskarton | Ökohaus Ibach | 11 Tage | Mi 27.05.09 | Fr 12.06.09 |
| 28 | Rohinstallation Heizung/Sanitär | Hierholzer | 10 Tage | Mo 15.06.09 | Fr 26.06.09 |
| 29 | Einbau Ganzhausheizung | Hierholzer | 5 Tage | Di 23.06.09 | Mo 29.06.09 |
| 30 | Durchbrüche schließen (dämmen, ausbetonieren) | *Eigenleistung* | 1 Tag? | Fr 26.06.09 | Fr 26.06.09 |
| 31 | Estrichverlegung | Estrichleger | 5 Tage | Mo 29.06.09 | Fr 03.07.09 |
| 32 | Trocknungsphase Estrich (ca. 6 Wochen) | | 30 Tage | Mo 06.07.09 | Fr 14.08.09 |
| 33 | Spachtelung Gipskartonwände | Gipser/Maler | 5 Tage | Mo 20.07.09 | Fr 24.07.09 |
| 34 | Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz aug GK | Gipser/Maler | 5 Tage | Mo 27.07.09 | Fr 31.07.09 |
| 35 | Verlegung Unterbau Dielenboden | *Eigenleistung* | 5 Tage | Mo 03.08.09 | Fr 07.08.09 |
| 36 | Fliesenarbeiten Wände | Rafael Renggli | 5 Tage | Mo 10.08.09 | Fr 14.08.09 |
| 37 | Verlegung Dielenboden | *Eigenleistung* | 5 Tage | Mo 17.08.09 | Fr 21.08.09 |
| 38 | Schleif- und Oberflächen-arbeiten Holzböden | Eigenleistung | 2 Tage | Mo 24.08.09 | Di 25.08.09 |
| 39 | Fliesenarbeiten Böden | Rafael Renggli | 5 Tage | Mo 17.08.09 | Fr 21.08.09 |
| 40 | Fertigmontage Elektro | Elsasser | 5 Tage | Mo 24.08.09 | Fr 28.08.09 |
| 41 | Fertigmontage Heizung/Sanitär | Hierholzer | 5 Tage | Mo 24.08.09 | Fr 28.08.09 |
| 42 | Einbau Treppe, Türen, Innengeländer | Ökohaus Ibach | 5 Tage | Mo 31.08.09 | Fr 04.09.09 |
| 43 | Fertigmontage Haustür | Ökohaus Ibach | 5 Tage | Mo 31.08.09 | Fr 04.09.09 |
| 44 | Montage Balko/Holzdeck und Aussengeländer | *Eigenleistung* | 5 Tage | Mo 31.08.09 | Fr 04.09.09 |
| 45 | Einbau Küche und Einbaumöbel | | 5 Tage | Mo 07.09.09 | Fr 11.09.09 |
| 46 | Reserve | | 10 Tage | Mo 14.09.09 | Fr 25.09.09 |
| 47 | Fertigstellung | | 1 Tag? | Mo 28.09.09 | Mo 28.09.09 |

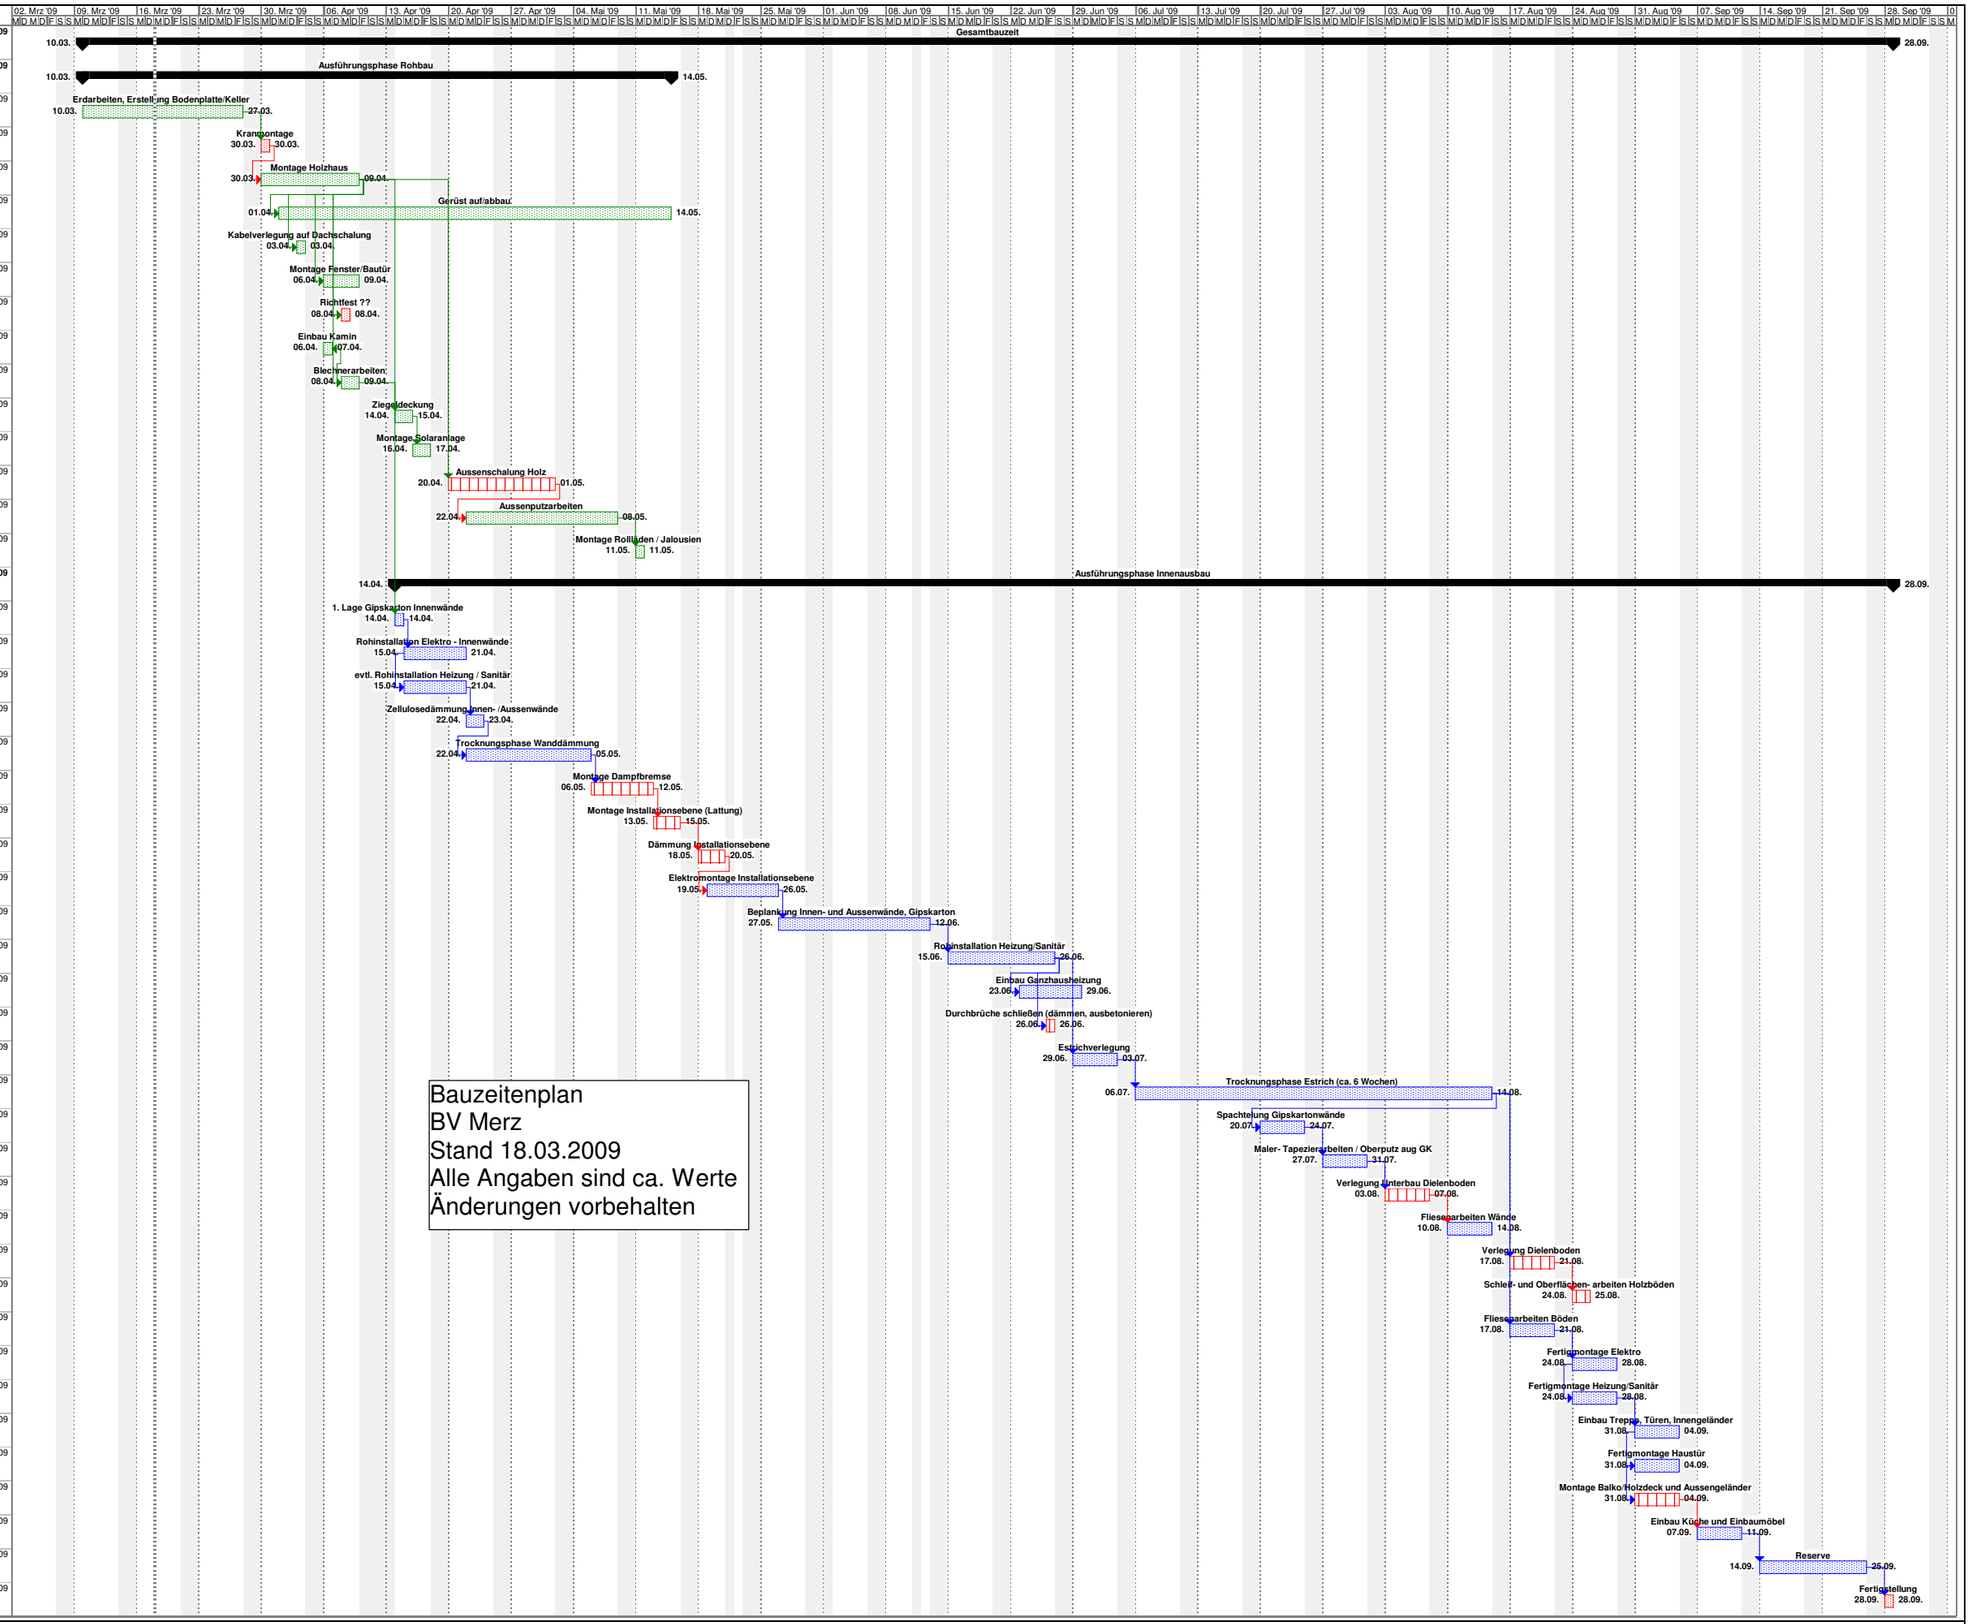


Projekt: Bauzeitenplan Merz 0903
Datum: Mi 18.03.09

Vorgang | Unterbrechung | In Arbeit | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag
