Nr.	Vorgangsname	Kontaktperson	Dauer	Anfang	Ende
1	**Gesamtbauzeit**		**140 Tage?**	**Fre 26.10.07**	**Don 08.05.08**
2	**Ausführungsphase Rohbau**		**96 Tage?**	**Fre 26.10.07**	**Fre 07.03.08**
3	Erdarbeiten, Erstellung Bodenplatte/Keller	Kellerbau	20 Tage	Fre 26.10.07	Don 22.11.07
4	Kranmontage	Ökohaus Ibach Kramer	1 Tag?	Die 11.12.07	Die 11.12.07
5	Montage Holzhaus	Ökohaus Ibach Sibold	8 Tage	Mit 12.12.07	Fre 21.12.07
6	Gerüst auf/abbau (witterungsabhängig, wegen Gipserarbeiten)	Gerüstbauer Gliese	30 Tage	Don 13.12.07	Mit 23.01.08
7	Kabelverlegung auf Dachschalung	Elektriker Bauseits	1 Tag	Mon 17.12.07	Mon 17.12.07
8	Montage Fenster	Ökohaus Ibach Knöpfle-Fischer	2 Tage	Mit 19.12.07	Don 20.12.07
9	Richtfest ??		1 Tag?	Mit 19.12.07	Mit 19.12.07
10	Dämmen des Dachs mit Isofloc	Ökohaus Ibach ZBÖ	1 Tag	Mit 19.12.07	Mit 19.12.07
11	Blechnerarbeiten	Blechner Bauseits	2 Tage	Don 20.12.07	Fre 21.12.07
12	Ziegeldeckung	Eigenleistung	2 Tage	Don 27.12.07	Fre 28.12.07
13	Aussenschalung Holz	Eigenleistung	10 Tage	Mit 02.01.08	Die 15.01.08
14	Aussenputz (witterungsabhängig)	Gipser Bauseits	14 Tage	Mon 07.01.08	Mit 05.03.08
15	Montage Rollläden / Jalousien	Ökohaus Ibach Kloker	2 Tage	Don 06.03.08	Fre 07.03.08
16	Krandemontage	Ökohaus Ibach Kramer	1 Tag?	Fre 04.01.08	Fre 04.01.08
17	**Ausführungsphase Innenausbau**		**92 Tage?**	**Mit 02.01.08**	**Don 08.05.08**
18	1. Lage Gipskarton Innenwände	Eigenleistung	2 Tage	Mit 02.01.08	Don 03.01.08
19	Rohinstallation Elektro - Innenwände	Elektriker Bauseits	5 Tage	Mon 07.01.08	Fre 11.01.08
20	evtl. Rohinstallation Heizung / Sanitär	Heizungs-/ Sanitärbauer Bauseits	7 Tage	Mon 07.01.08	Don 07.02.08
21	Aussenwand,- Innenwand dämmen mit Gutex Holzflex	Eigenleistung	4 Tage	Fre 08.02.08	Mit 13.02.08
22	Montage Dampfbremse	Eigenleistung	2 Tage	Fre 11.01.08	Mon 14.01.08
23	Montage Installationsebene (Lattung)	Eigenleistung	2 Tage	Die 15.01.08	Mit 16.01.08
24	Elektromontage Installationsebene	Elektriker Bauseits	5 Tage	Don 17.01.08	Mit 23.01.08
25	Beplankung Innen- und Aussenwände, Gipskarton	Eigenleistung	7 Tage	Don 24.01.08	Fre 01.02.08
26	Rohinstallation Heizung/Sanitär	Heizungs-/ Sanitärbauer Bauseits	5 Tage	Mon 04.02.08	Fre 08.02.08
27	Durchbrüche schließen (dämmen, ausbetonieren)	Eigenleistung	1 Tag?	Fre 08.02.08	Fre 08.02.08
28	Estrichverlegung	Estrichleger Bauseits	3 Tage	Mon 11.02.08	Mit 13.02.08
29	Trocknungsphase Estrich (ca. 6 Wochen)		30 Tage	Don 14.02.08	Mit 26.03.08
30	Spachtelung Gipskartonwände	Gipser/Maler Bauseits	5 Tage	Don 21.02.08	Mit 27.02.08
31	Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz aug GK	Gipser/Maler Bauseits	5 Tage	Don 28.02.08	Mit 05.03.08
32	Verlegung Unterbau Dielenboden	Eigenleistung	5 Tage	Don 06.03.08	Mit 12.03.08
33	Fliesenarbeiten Wände	Fliesenleger Bauseits	5 Tage	Don 13.03.08	Mit 19.03.08
34	Verlegung Dielenboden	Eigenleistung	5 Tage	Don 27.03.08	Mit 02.04.08
35	Schleif- und Oberflächen-arbeiten Holzböden	Eigenleistung	5 Tage	Don 03.04.08	Mit 09.04.08
36	Fliesenarbeiten Böden	Fliesenleger Bauseits	5 Tage	Don 27.03.08	Mit 02.04.08
37	Fertigmontage Elektro	Elektriker	5 Tage	Don 03.04.08	Mit 09.04.08
38	Fertigmontage Heizung/Sanitär	Heizungs-/ Sanitärbauer	5 Tage	Don 03.04.08	Mit 09.04.08
39	Einbau Treppe, Türen, Innengeländer	Ökohaus Ibach Schmidt	5 Tage	Don 10.04.08	Mit 16.04.08
40	Fertigmontage Haustür	Ökohaus Ibach Schmidt	5 Tage	Don 10.04.08	Mit 16.04.08
41	Montage Balko/Holzdeck und Aussengeländer	Eigenleistung	5 Tage	Don 10.04.08	Mit 16.04.08
42	Einbau Küche und Einbaumöbel	Eigenleistung	5 Tage	Don 17.04.08	Mit 23.04.08
43	Reserve		10 Tage	Don 24.04.08	Mit 07.05.08
44	Fertigstellung		1 Tag?	Don 08.05.08	Don 08.05.08

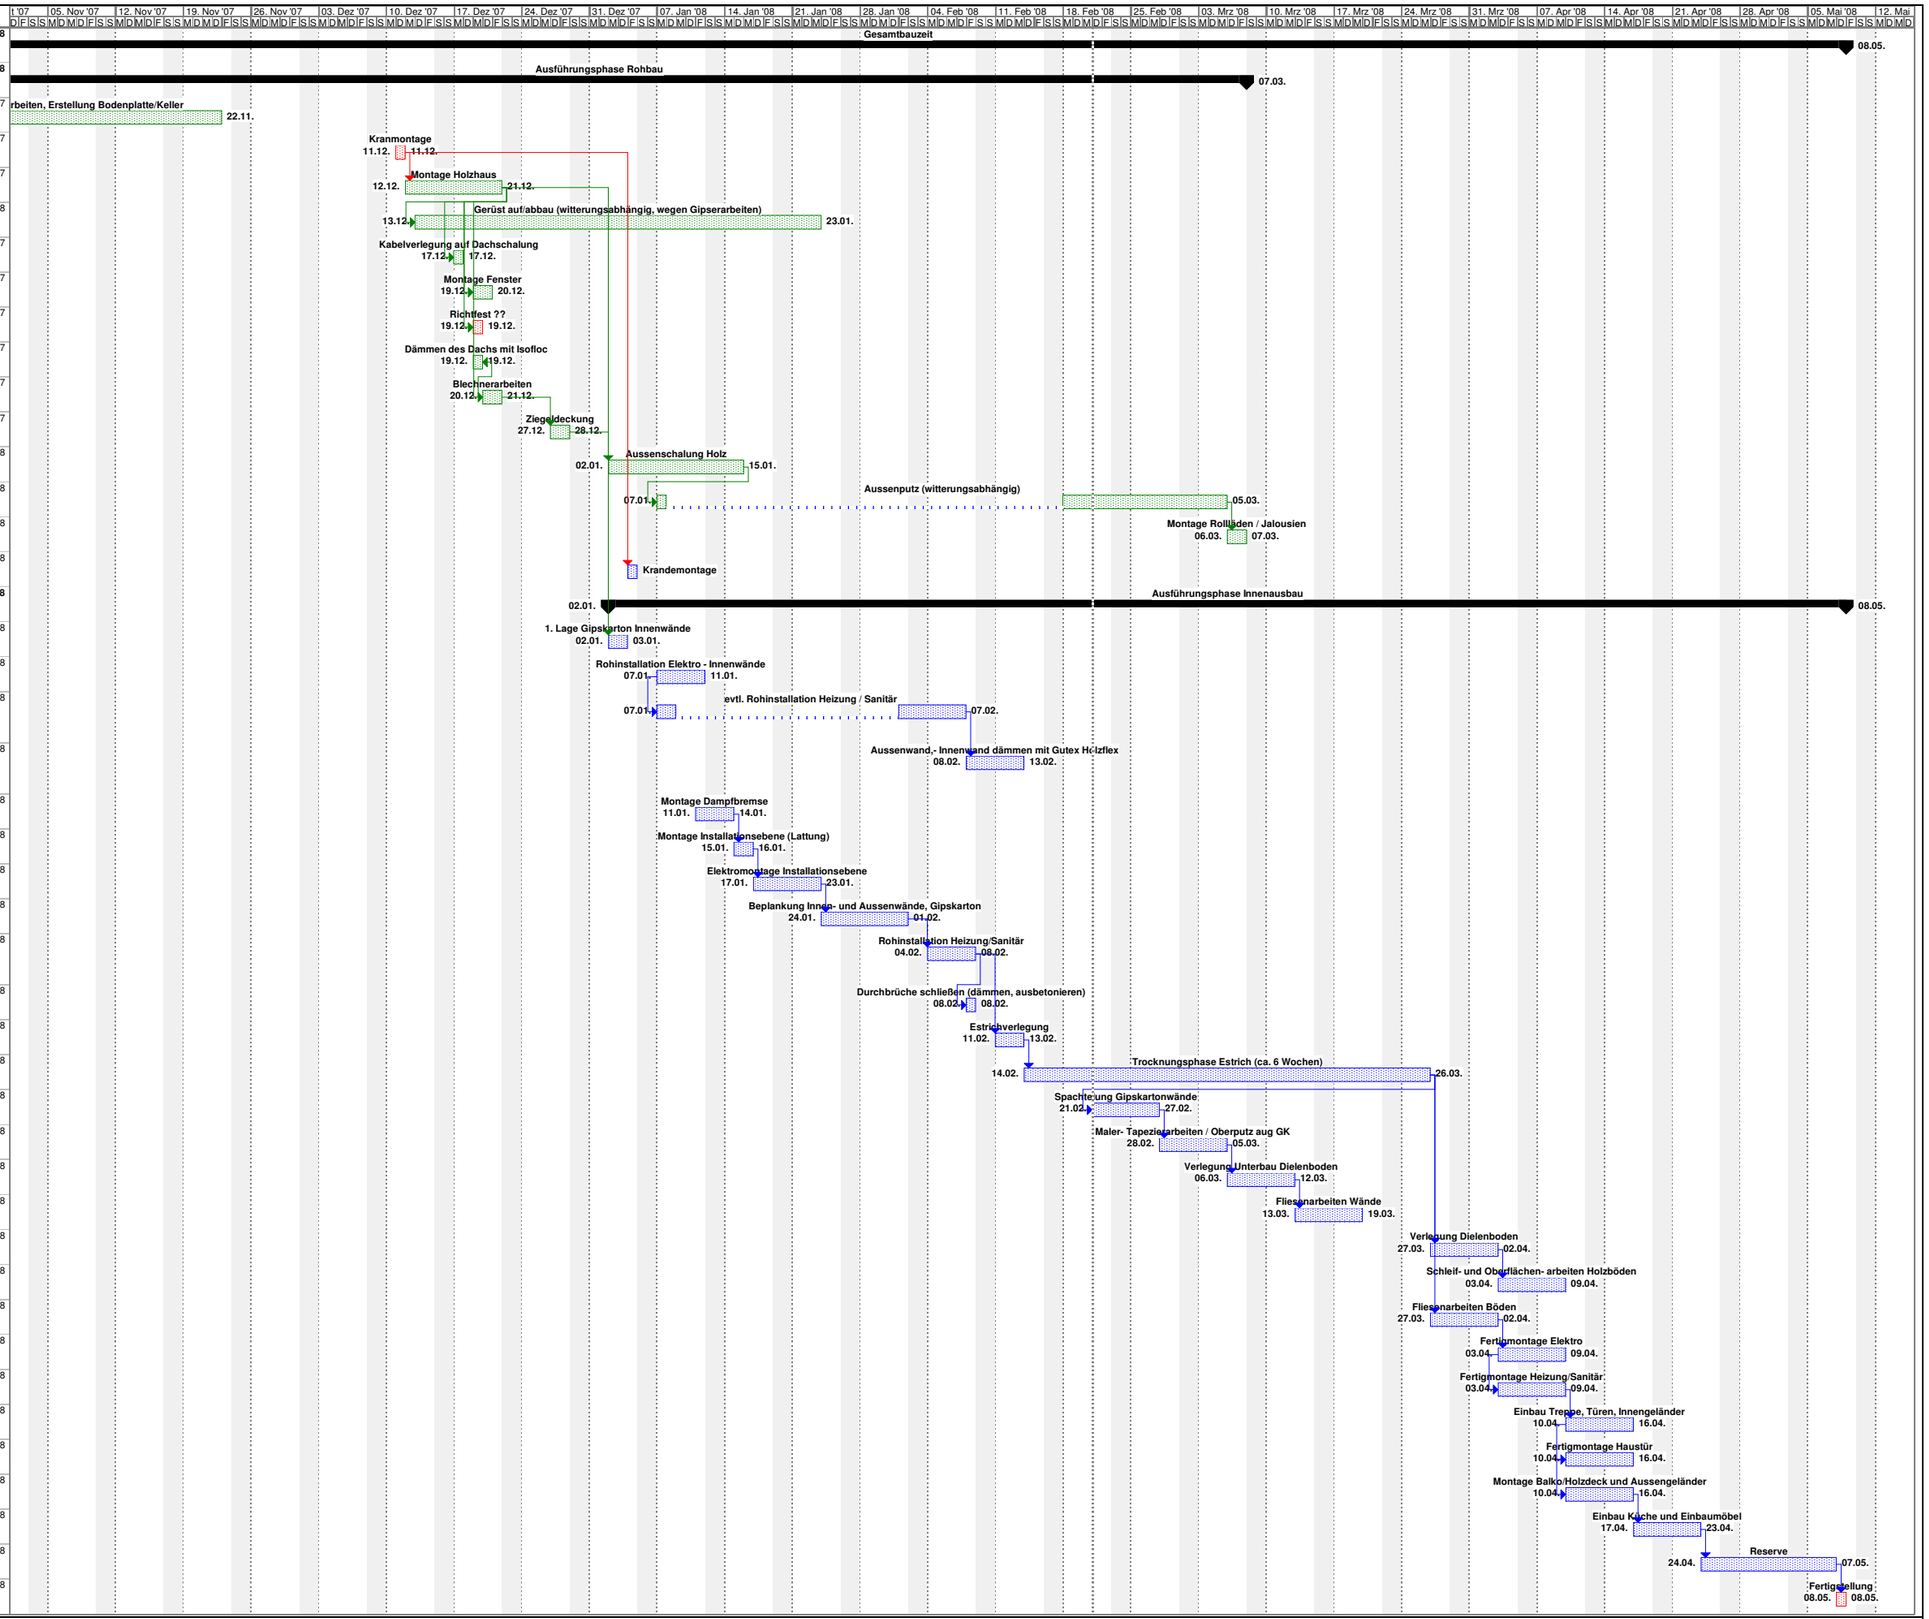

Projekt: Bauzeitenplan Rosenstie
Datum: Don 21.02.08

Vorgang | Unterbrechung | In Arbeit | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag
