Nr.	Vorgangsname	Kontaktperson	Dauer	Anfang	Ende
1	**Gesamtbauzeit**		**161 Tage**	**Mo 23.03.09**	**Mo 09.11.09**
2	**Ausführungsphase Rohbau**		**60 Tage**	**Mo 23.03.09**	**Fr 19.06.09**
3	Erdarbeiten, Erstellung Bodenplatte/Keller	Kellerbau	23 Tage	Mo 23.03.09	Do 23.04.09
4	Kranmontage	Okohaus Ibach	1 Tag	Fr 24.04.09	Fr 24.04.09
5	Montage Holzhaus	Okohaus Ibach	9 Tage	Mo 27.04.09	Fr 08.05.09
6	Gerüst auf/abbau	Gerüstbauer	30 Tage	Di 28.04.09	Fr 12.06.09
7	Kabelverlegung auf Dachschalung	Elektriker	1 Tag	Mo 04.05.09	Mo 04.05.09
8	Montage Fenster/Haustür	Ökohaus Ibach	2 Tage	Mo 11.05.09	Di 12.05.09
9	Richtfest ??		1 Tag	Di 12.05.09	Di 12.05.09
10	Einbau Kamin	Ökohaus Ibach	1 Tag	Di 05.05.09	Mi 06.05.09
11	Blechnerarbeiten	Blechner	2 Tage	Do 07.05.09	Fr 08.05.09
12	Ziegeldeckung	Okohaus Ibach	2 Tage	Mo 11.05.09	Di 12.05.09
13	Aussenschalung Holz	Okohaus Ibach	9 Tage	Mo 11.05.09	Fr 22.05.09
14	Aussenputzarbeiten	Gipser	13 Tage	Di 19.05.09	Mo 08.06.09
15	Montage Rollläden / Jalousien	Okohaus Ibach	1 Tag	Di 09.06.09	Di 09.06.09
16	Restarbeiten Keller: Dämmung/Durchbrüche	Kellerbau	5 Tage	Mo 15.06.09	Fr 19.06.09
17	**Ausführungsphase Innenausbau**		**128 Tage**	**Mo 11.05.09**	**Mo 09.11.09**
18	Rohinstallation Elektro - Innenwände	Elektriker	9 Tage	Mo 11.05.09	Fr 22.05.09
19	evtl. Rohinstallation Heizung / Sanitär	Elektriker	9 Tage	Mo 11.05.09	Fr 22.05.09
20	Zellulosedämmung Innen- /Aussenwände	Okohaus Ibach	2 Tage	Mo 25.05.09	Di 26.05.09
21	Trocknungsphase Wanddämmung		9 Tage	Mo 25.05.09	Fr 05.06.09
22	Montage Dampfbremse	Ökohaus Ibach	3 Tage	Mo 08.06.09	Mi 10.06.09
23	Montage Installationsebene (Lattung)	Ökohaus Ibach	2 Tage	Fr 12.06.09	Mo 15.06.09
24	Elektromontage Installationsebene	Elektriker	4 Tage	Di 16.06.09	Fr 19.06.09
25	Beplankung Innen- und Aussenwände, Gipskarton	Okohaus Ibach	14 Tage	Mo 22.06.09	Do 09.07.09
26	Rohinstallation Heizung/Sanitär	Heizungs-/ Sanitärbauer	10 Tage	Fr 03.07.09	Do 16.07.09
27	Durchbrüche schließen (dämmen, ausbetonieren)	Eigenleistung	1 Tag	Do 16.07.09	Do 16.07.09
28	Schüttung DG	Estrichleger	2 Tage	Fr 17.07.09	Mo 20.07.09
29	Trocknungsphase Schüttung		5 Tage	Fr 17.07.09	Do 23.07.09
30	Dämmung Fußboden	Estrichleger	1 Tag	Fr 24.07.09	Fr 24.07.09
31	Fußbodenheizung	Heizungs-/ Sanitärbauer	2 Tage	Mo 27.07.09	Di 28.07.09
32	Estrichverlegung	Estrichleger	2 Tage	Mi 29.07.09	Do 30.07.09
33	Trocknungsphase Estrich (ca. 6 Wochen)		30 Tage	Fr 31.07.09	Do 10.09.09
34	Inbetriebnahme Heizung	Heizungs-/ Sanitärbauer	1 Tag	Fr 07.08.09	Fr 07.08.09
35	Handwerkerferien		10 Tage	Mo 03.08.09	Fr 14.08.09
36	Spachtelung Gipskartonwände	Gipser/Maler	7 Tage	Mo 17.08.09	Di 25.08.09
37	Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz auf GK	Gipser/Maler	8 Tage	Mi 26.08.09	Fr 04.09.09
38	Fliesenarbeiten Wände	Fliesenleger	5 Tage	Mo 07.09.09	Fr 11.09.09
39	Fliesenarbeiten Böden	Fliesenleger	5 Tage	Mo 14.09.09	Fr 18.09.09
40	Fertigmontage Haustür	Ökohaus Ibach	5 Tage	Do 17.09.09	Mi 23.09.09
41	Montage Balko/Holzdeck und Aussengeländer	Okohaus Ibach	7 Tage	Do 24.09.09	Fr 02.10.09
42	Verlegung Parkett	Okohaus Ibach	10 Tage	Mo 21.09.09	Fr 02.10.09
43	Einbau Treppe, Türen, Innengeländer	Okohaus Ibach	5 Tage	Mo 05.10.09	Fr 09.10.09
44	Fertigmontage Elektro	Elektriker	5 Tage	Mo 12.10.09	Fr 16.10.09
45	Fertigmontage Heizung/Sanitär	Heizungs-/ Sanitärbauer	5 Tage	Mo 12.10.09	Fr 16.10.09
46	Einbau Küche und Einbaumöbel		5 Tage	Mo 19.10.09	Fr 23.10.09
47	Reserve		10 Tage	Mo 26.10.09	Fr 06.11.09
48	Fertigstellung		1 Tag	Mo 09.11.09	Mo 09.11.09

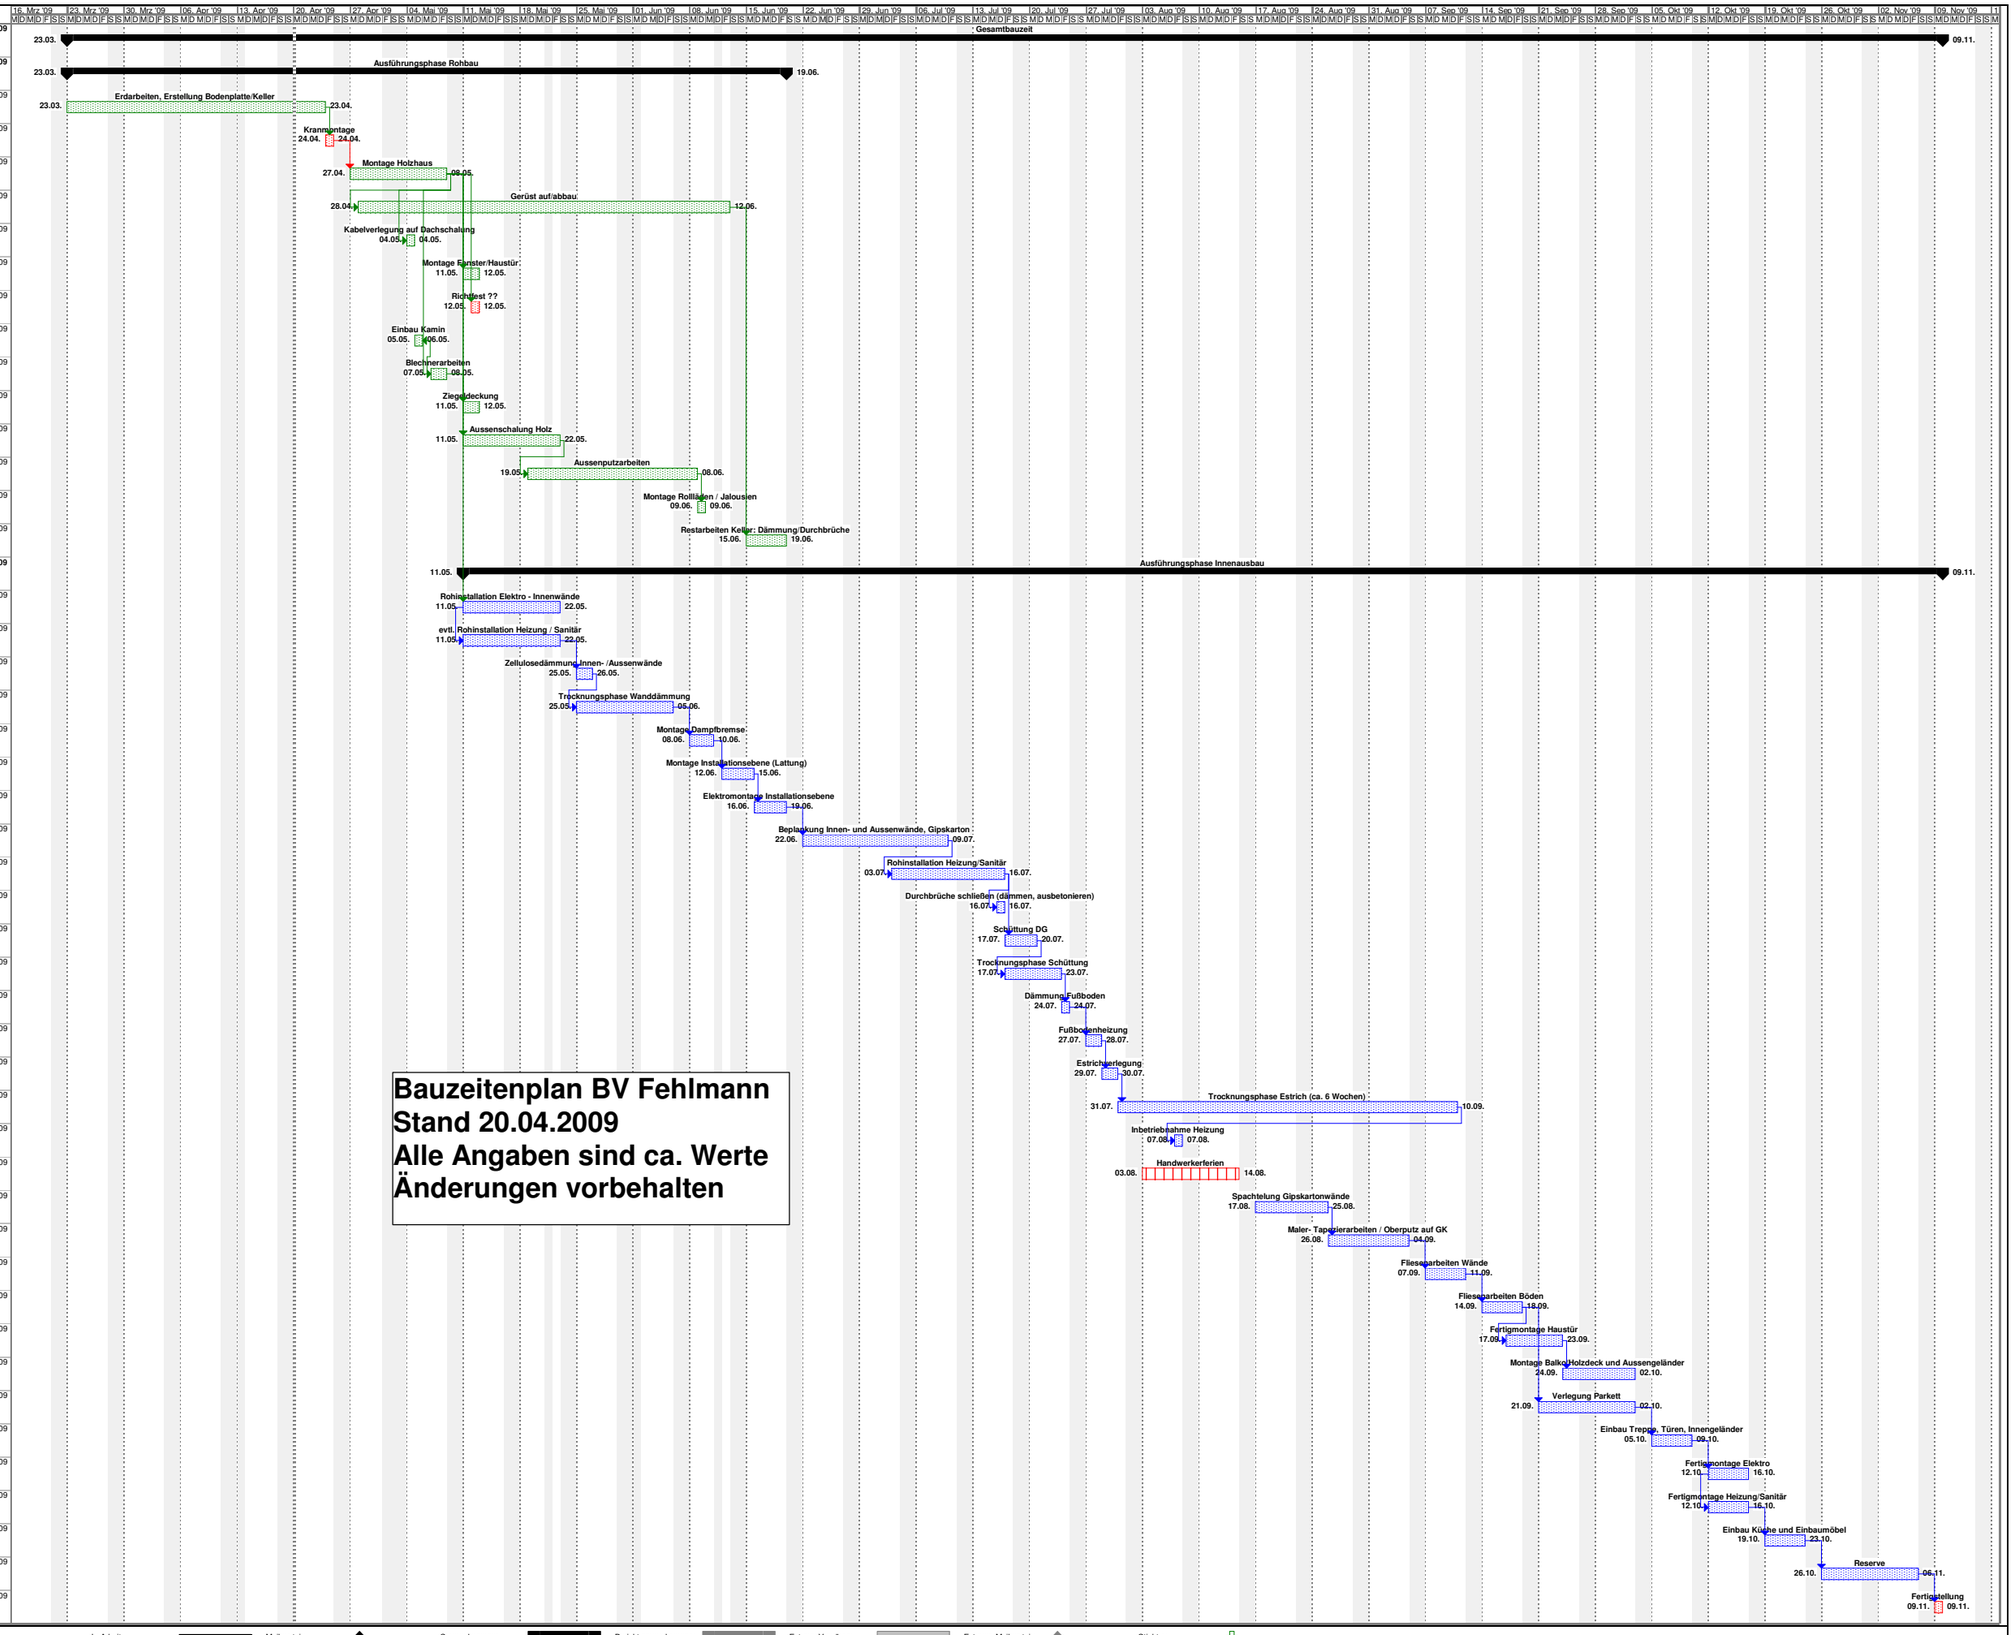

Projekt: Fehlmann 20090420.mpp
Datum: Mo 20.04.09

Vorgang | Unterbrechung | In Arbeit | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag
