Nr.	Vorgangsname	Kontaktperson	Dauer	Anfang	Ende
1	**Gesamtbauzeit**		**34 Tage?**	**Fr 03.04.09**	**Di 19.05.09**
2	**Ausführungsphase Rohbau**		**23 Tage?**	**Fr 03.04.09**	**Mo 04.05.09**
3	Erdarbeiten, Erstellung Fundament Schliesen	Hogg	2 Tage	Fr 03.04.09	Sa 04.04.09
4	Rückbau und Montage Bauwand	Ökohaus Ibach	1 Tag	Mo 06.04.09	Mo 06.04.09
5	Montage Wintergarten	Ökohaus Ibach	3 Tage	Di 07.04.09	Do 09.04.09
6	Montage Holzdeck	Ökohaus Ibach	2 Tage	Do 09.04.09	Fr 10.04.09
7	Montage Metallpergola	Ökohaus Ibach	1 Tag	Do 09.04.09	Do 09.04.09
8	Kabelverlegung auf Dachschalung	Elektriker	1 Tag	Mi 08.04.09	Mi 08.04.09
9	Montage Fenster	Ökohaus Ibach	1 Tag	Mi 08.04.09	Mi 08.04.09
10	Dachabdichtung	Blechner	2 Tage	Di 14.04.09	Mi 15.04.09
11	Blechnerarbeiten	Blechner	2 Tage	Do 16.04.09	Fr 17.04.09
12	Aussenputzarbeiten	Gipser	15 Tage	Mo 13.04.09	Fr 01.05.09
13	Montage Rollläden / Jalousien	Ökohaus Ibach	1 Tag?	Mo 04.05.09	Mo 04.05.09
14	**Ausführungsphase Innenausbau**		**29 Tage?**	**Do 09.04.09**	**Di 19.05.09**
15	Gipskarton Innenwände	Ökohaus Ibach	1 Tag	Do 09.04.09	Do 09.04.09
16	Rohinstallation Elektro - Innenwände	Elektriker	3 Tage	Do 09.04.09	Mo 13.04.09
17	RohinstallationFußbodenheizu	Hierholzer	1 Tag	Di 14.04.09	Di 14.04.09
18	Estrichverlegung	Estrichleger	1 Tag	Mi 15.04.09	Mi 15.04.09
19	Trocknungsphase Estrich (ca2Wochen)		11 Tage	Do 16.04.09	Do 30.04.09
20	Estrich aufheizen	Hierholzer	3 Tage	Di 21.04.09	Do 23.04.09
21	Estrich aufheizen Temperatur steigern	Hierholzer	2 Tage	Fr 24.04.09	Mo 27.04.09
22	Estrich aufheizen Temperatur senken	Hierholzer	2 Tage	Di 28.04.09	Mi 29.04.09
23	Spachtelung Gipskartonwände	Gipser/Maler	1 Tag	Mi 29.04.09	Mi 29.04.09
24	Maler- Tapezierarbeiten / Oberputz WG neu	Gipser/Maler	1 Tag	Do 30.04.09	Do 30.04.09
25	Verlegung Parkettboden	Ökohaus Ibach	1 Tag	Fr 01.05.09	Fr 01.05.09
26	Fertigmontage Elektro	Elektriker	1 Tag	Mo 04.05.09	Mo 04.05.09
27	Montage Belag Holzdeck	Ökohaus Ibach	4 Tage	Di 05.05.09	Fr 08.05.09
28	Gartengestaltung	Gärtner	20 Tage	Mo 13.04.09	Fr 08.05.09
29	Reserve		6 Tage	Mo 11.05.09	Mo 18.05.09
30	Fertigstellung		1 Tag?	Di 19.05.09	Di 19.05.09

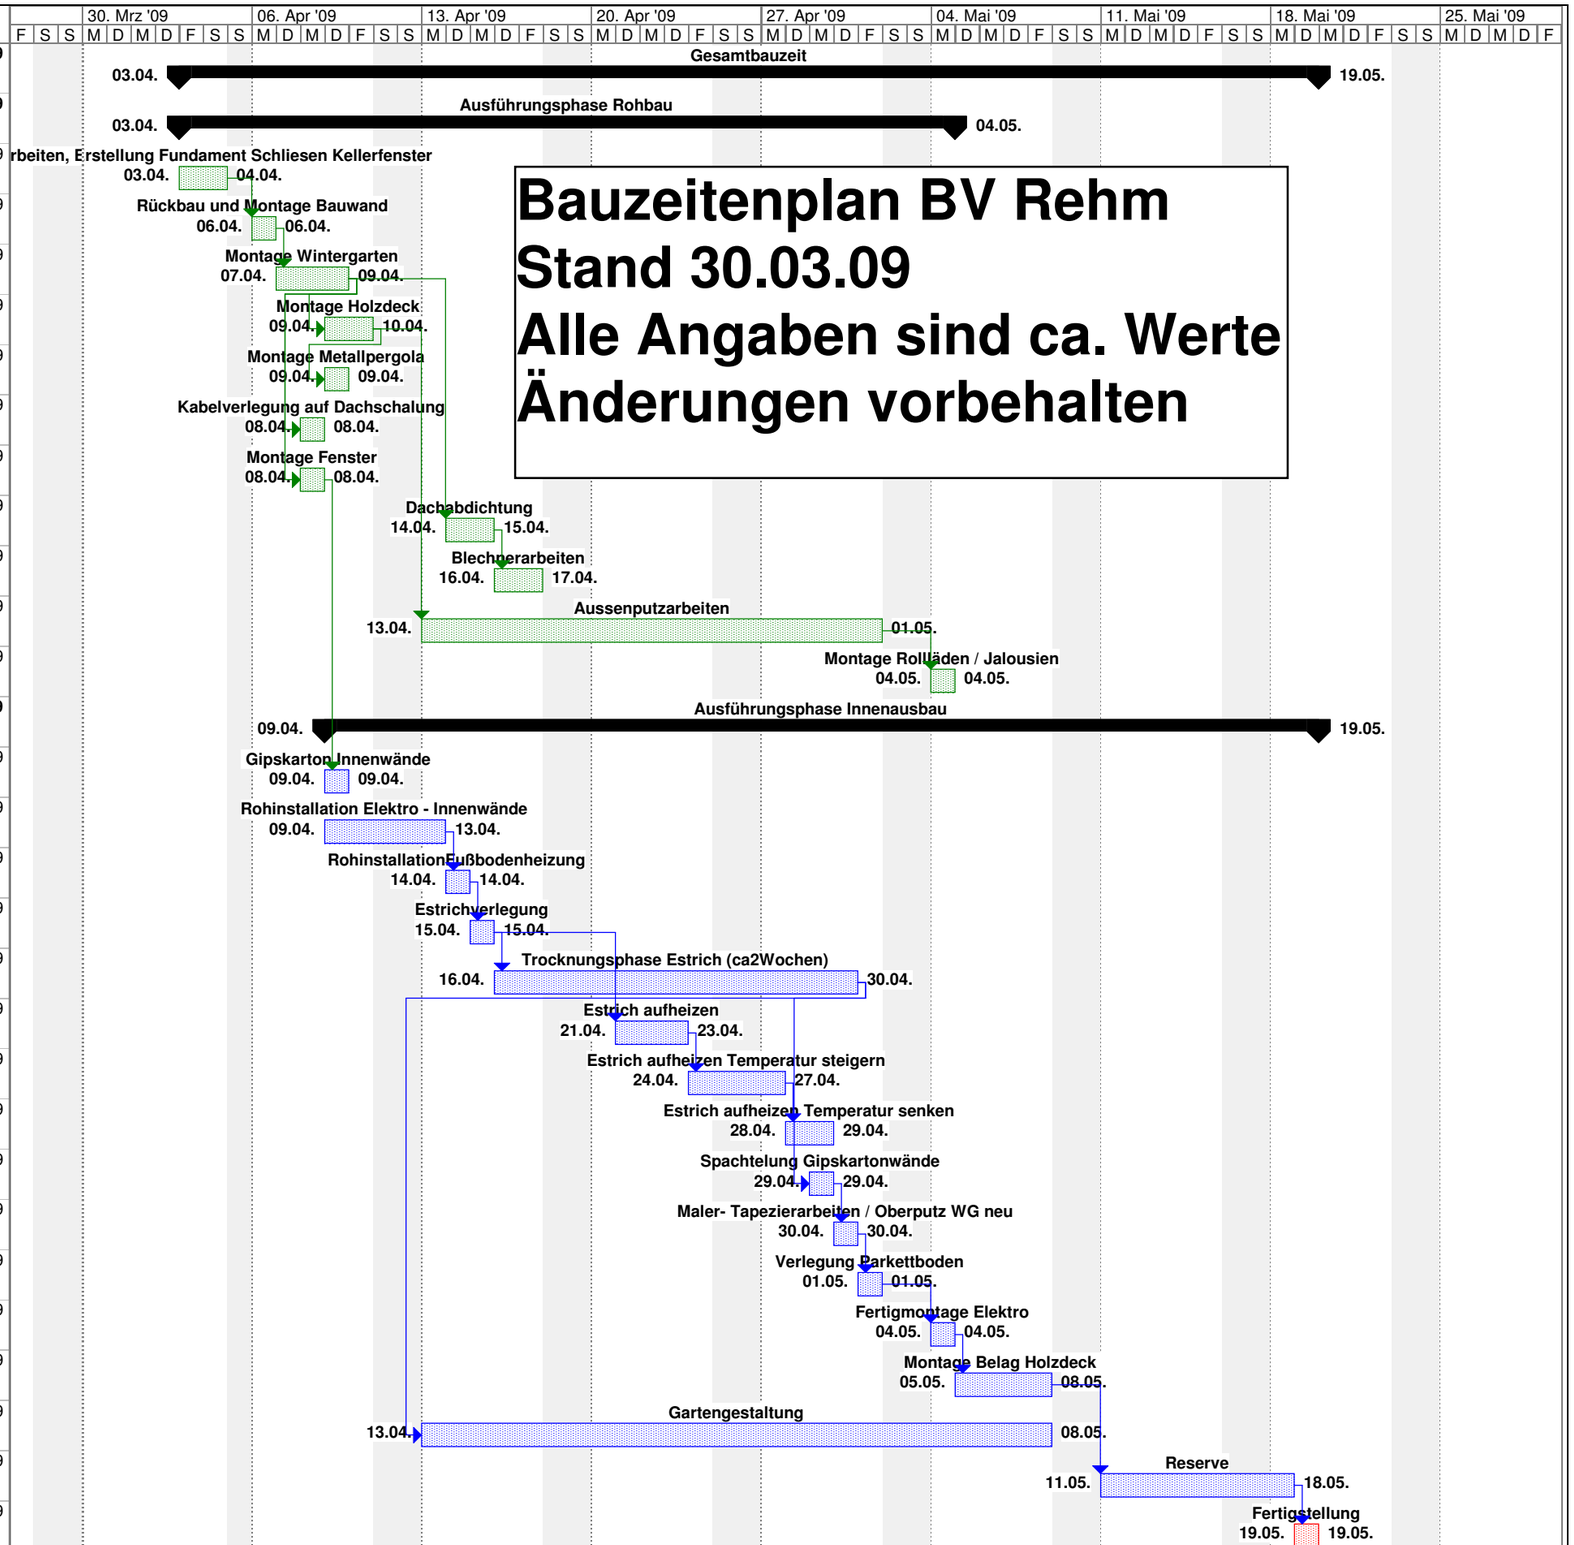

Projekt: BZP Rehm 300320mpp.m
Datum: Mo 30.03.09

Vorgang | In Arbeit | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Stichtag
Unterbrechung | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein
