Nr.	Vorgangsname	Kontaktperson	Dauer	Anfang	Ende
1	**Gesamtbauzeit**		**66 Tage**	**Mo 07.01.08**	**So 06.04.08**
2	**Ausführungsphase Rohbau**		**5 Tage**	**Mo 10.03.08**	**Fr 14.03.08**
3	Sockelputzarbeiten aussen	Gipser	5 Tage	Mo 10.03.08	Fr 14.03.08
4	**Ausführungsphase Innenausbau**		**66 Tage**	**Mo 07.01.08**	**So 06.04.08**
5	Schüttung	Estrichleger	1 Tag	Mo 07.01.08	Mo 07.01.08
6	Trocknung Schüttung		5 Tage	Mo 07.01.08	Fr 11.01.08
7	Dämmung Fußboden		1 Tag	Mo 14.01.08	Mo 14.01.08
8	Verlegung Fußbodenheizung	Heizungs-Sanitärbauer	2 Tage	Di 15.01.08	Mi 16.01.08
9	Estrichverlegung	Estrichleger	1 Tag	Do 17.01.08	Do 17.01.08
10	Trocknungsphase Estrich (ca. 6 Wochen)		30 Tage	Fr 18.01.08	Do 28.02.08
11	Inbetriebnahme Heizung	Heizungs-Sanitärbauer	1 Tag	Mo 14.01.08	Mo 14.01.08
12	Unterbau Dielenboden HWF 18 mm	Ökohaus Ibach	5 Tage	Mo 21.01.08	Fr 25.01.08
13	Spachtelung Gipskartonwände (Eigenleistung??)	Gipser/Maler	12 Tage	Mo 28.01.08	Di 12.02.08
14	Oberputz auf GK	Gipser/Maler	20 Tage	Mo 11.02.08	Fr 07.03.08
15	Unterbau Dielenboden	*Eigenleistung*	3 Tage	Mi 13.02.08	Fr 15.02.08
16	Dielenboden	*Eigenleistung*	15 Tage	Mo 18.02.08	Fr 07.03.08
17	Einbau Treppe, Türen, Innengeländer	Ökohaus Ibach	5 Tage	Mo 25.02.08	Fr 29.02.08
18	Fliesenarbeiten Wände	Fliesenleger	4 Tage	Mi 05.03.08	Mo 10.03.08
19	Fliesenarbeiten Böden	Fliesenleger	4 Tage	Di 11.03.08	Fr 14.03.08
20	Fertigmontage Elektro	Elektriker	10 Tage	Mo 10.03.08	Fr 21.03.08
21	Fertigmontage Heizung/Sanitär	Heizungs-/ Sanitärbauer	10 Tage	Mo 10.03.08	Fr 21.03.08
22	Einbau Treppe, Türen, Innengeländer	Ökohaus Ibach	5 Tage	Mo 17.03.08	Fr 21.03.08
23	Fertigmontage Haustür	Ökohaus Ibach	5 Tage	Mo 17.03.08	Fr 21.03.08
24	Montage Balko/Holzdeck	*Eigenleistung*	5 Tage	Mo 17.03.08	Fr 21.03.08
25	Einbau Küche und Einbaumöbel		5 Tage	Mo 24.03.08	Fr 28.03.08
26	Reserve		5 Tage	Mo 31.03.08	Fr 04.04.08
27	Tag der offenen Tür		1 Tag	So 06.04.08	So 06.04.08

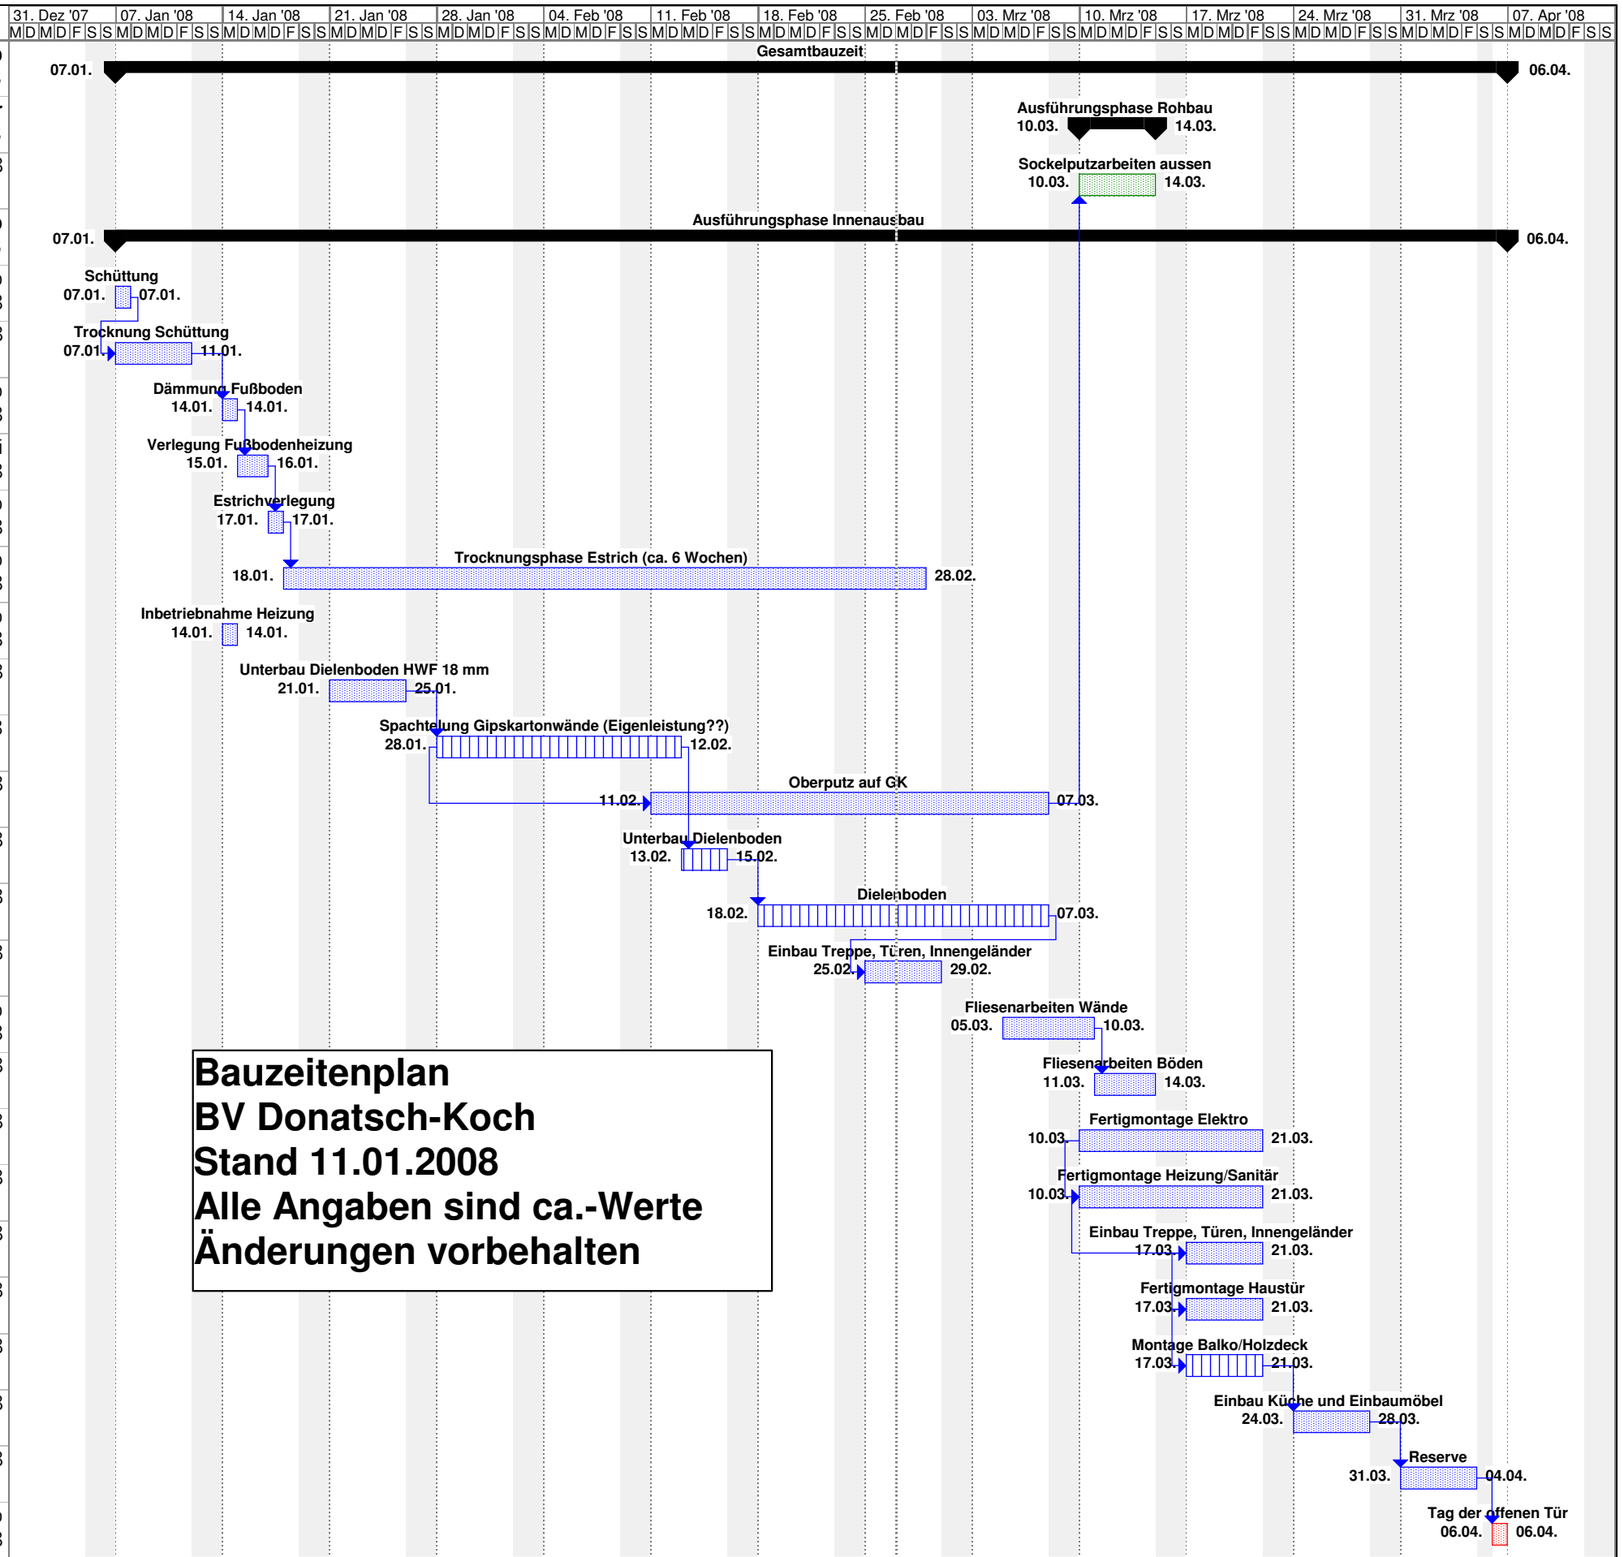

Bauzeitenplan
BV Donatsch-Koch
Stand 11.01.2008
Alle Angaben sind ca.-Werte
Änderungen vorbehalten

Projekt: Donatsch-Koch 2008220
Datum: Mi 27.02.08

Vorgang | In Arbeit | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Stichtag
Unterbrechung | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein
